

建筑劳务管理系统使用教程

本文档用于培训公司内部员工使用系统。教程以日常高频操作为主，适合预算员、项目经理、财务、老板、现场人员和系统管理员查看。

说明：文档中的截图基于当前系统页面生成，实际数据会根据登录账号权限、项目分配和录入数据不同而变化。


一、使用前准备

1. 登录要求

系统后续以钉钉账号为主，用户名优先显示钉钉真实姓名。正常情况下，未绑定钉钉的人员不应进入系统。

使用前请确认：

- 已经加入公司钉钉组织。
- 管理员已经在系统中创建或同步了你的账号。
- 管理员已经给你分配了岗位和项目权限。
- 如果你负责某些项目，管理员需要在项目分配中勾选你的负责项目。

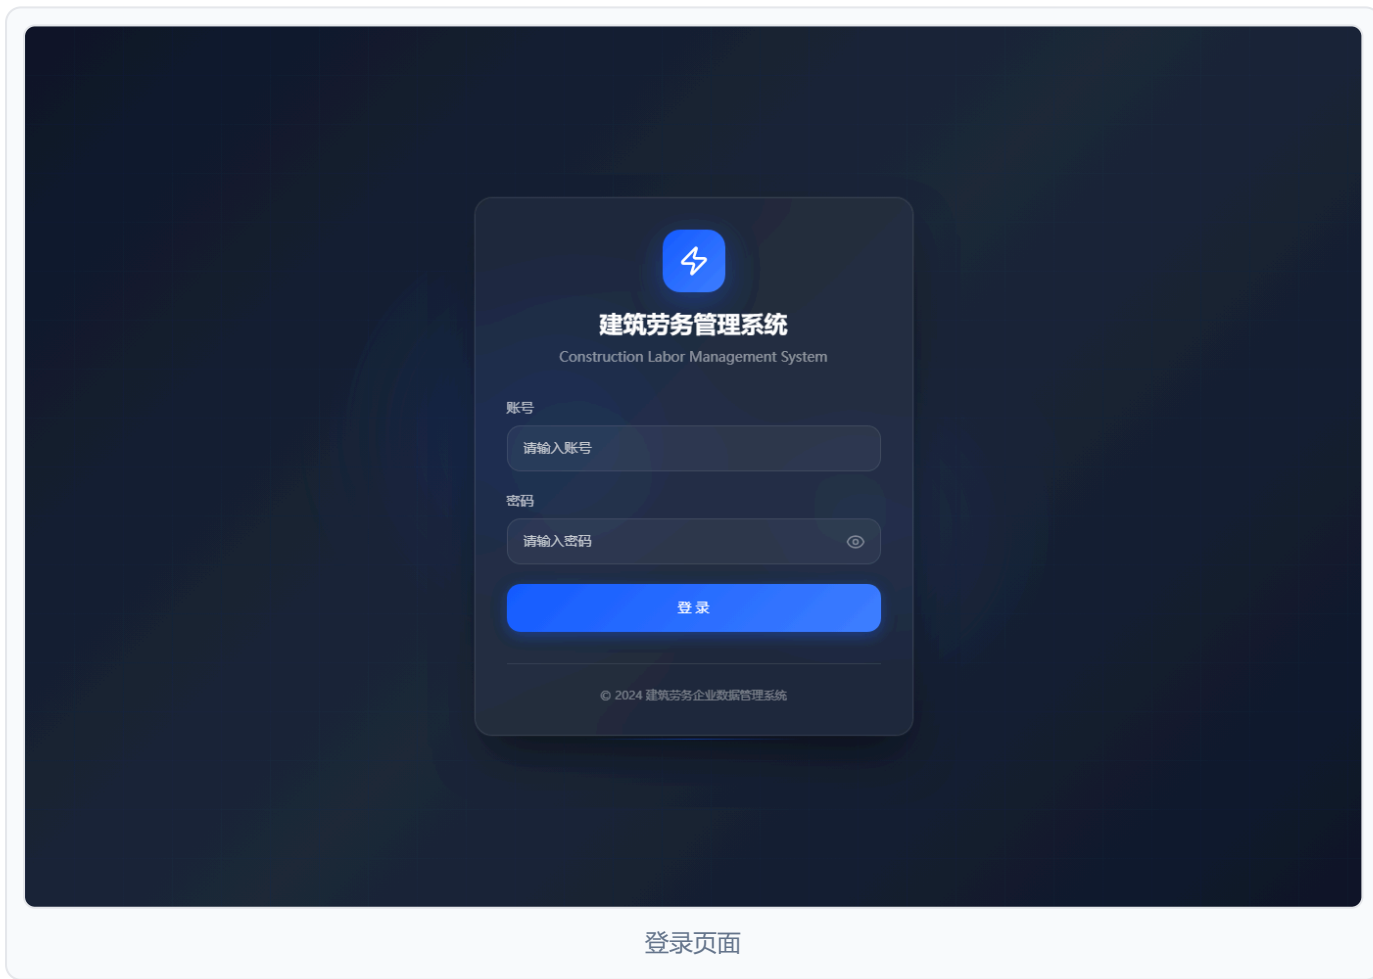

登录页面

2. 权限说明

系统页面和数据会按照岗位与项目权限显示：

- 预算员：主要处理项目报量、签证、月度分析、收付款查看、投标测算。
- 项目经理：主要处理施工日志、签证推进、现场确认、出勤人员。
- 财务：主要处理工资发放、供应商付款、甲方回款、资金分析。
- 老板：主要查看经营分析、项目应收、成本利润、资金情况。
- 现场人员：主要填写施工日志、零星材料、拍照识别、出勤信息。
- 超级管理员：配置用户、权限、钉钉、WPS、通知、流程、AI。

如果你看不到某个项目或页面，通常是权限或项目分配未配置。

二、整体页面结构

系统左侧为一级导航，顶部为当前页面标题、消息提醒和用户信息。


一级导航包括：

1. 工作台
2. 项目管理
3. 施工管理
4. 人力资源
5. 供应商与费用
6. 经营分析
7. 投标测算
8. 知识库
9. 系统管理

移动端使用顶部菜单按钮打开左侧抽屉。

三、工作台使用

工作台面向所有员工，只保留高频操作入口和待我办理。

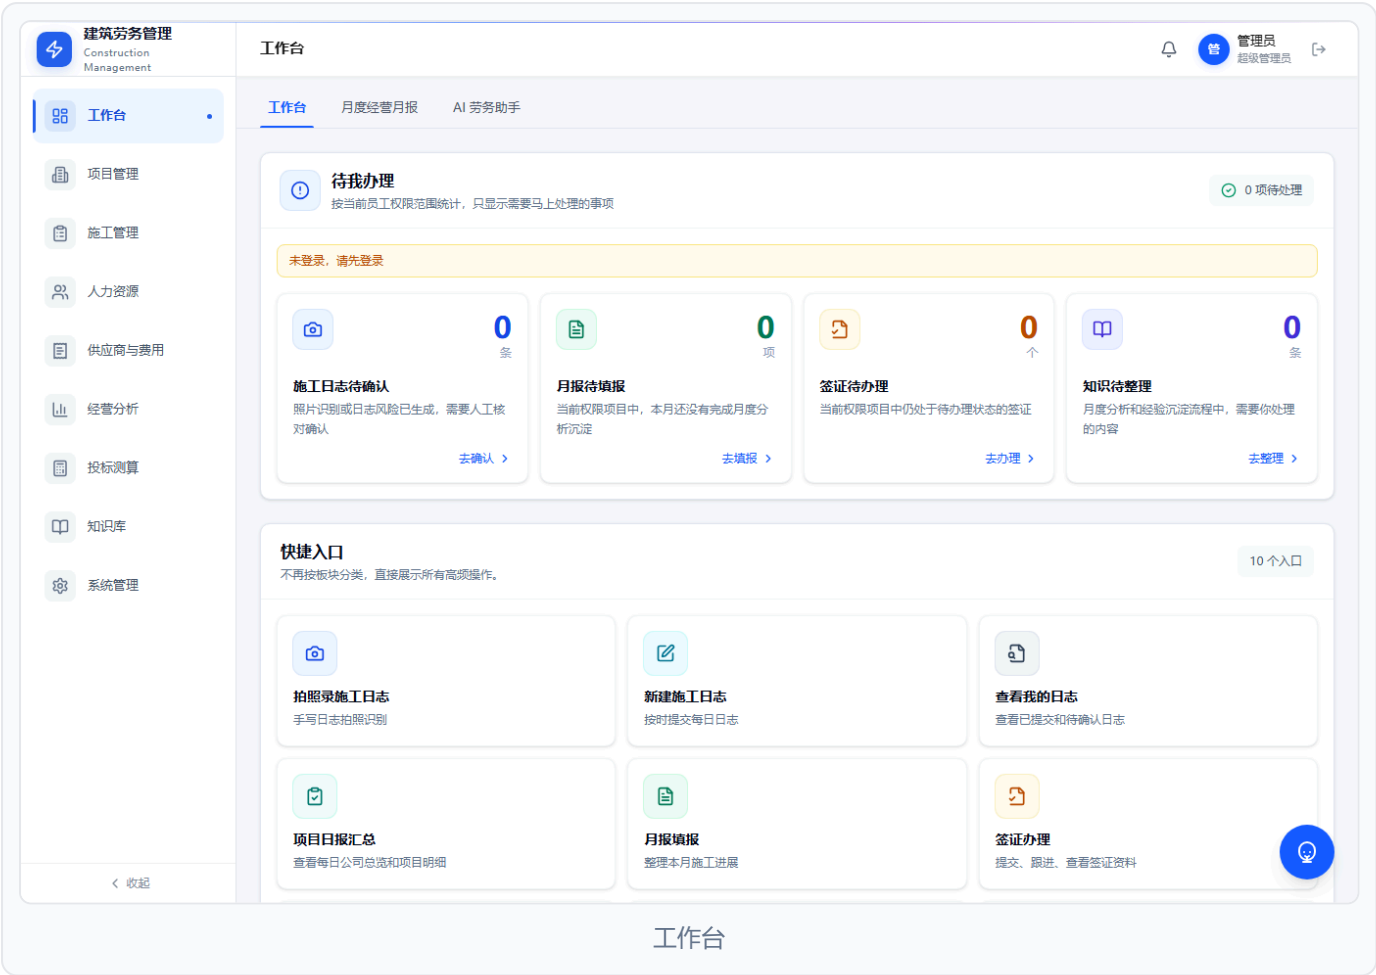

操作步骤

- 1. 登录后进入工作台。
- 2. 查看“待我办理”，确认是否有需要马上处理的事项。
- 3. 点击对应快捷入口进入业务页面。
- 4. 如果待办数量异常，先刷新页面；仍异常时联系管理员检查权限和通知配置。

使用建议

- 预算员每天先看待办，再进入项目管理和经营相关页面。
- 项目经理每天优先处理施工日志和签证提醒。
- 财务每天关注付款、发放和回款相关待办。

四、项目管理

项目管理是项目基础档案、报量、签证、产值结算、甲方回款的核心入口。



项目管理包含五个页签：

- 项目信息
- 报量管理
- 签证
- 产值结算
- 甲方回款

1. 项目信息

用于维护项目基础档案。

常用字段包括：

- 项目名称
- 甲方
- 地址
- 合同金额
- 年度
- 项目状态
- 负责人
- 不同状态下的付款比例

新增项目步骤

1. 进入“项目管理”。
2. 点击“项目信息”。
3. 点击“新增项目”。
4. 填写项目名称、甲方、地址、合同金额、年度等基础信息。
5. 维护项目状态和对应付款比例。
6. 保存后，项目会进入项目台账。

2. 报量管理

报量管理用于管理预算工程量、对上报量、对下结算量和内部附加清单。

使用逻辑：

- 预算工程量作为统一基础维度。
- 对上报量用于记录向甲方申报的工程量。
- 对下结算量用于记录对班组或工人的结算量。
- 内部附加清单只参与金额差异，不参与工程量差异。

报量查看步骤

1. 进入“项目管理”。
2. 点击“报量管理”。
3. 选择项目。
4. 查看项目整体汇总。
5. 下钻查看清单项明细。
6. 查看历史报量，核对当月、累计和剩余量。

3. 签证

签证用于记录现场签证从发起到最终确认计入结算的全过程。

签证流程：

1. 预算员录入签证内容和附件。
2. 预算员提交给项目经理。
3. 项目经理线下找甲方工程部签字。
4. 签字后，项目经理上传新附件，原附件完全替换。
5. 项目经理继续找甲方商务确认金额。
6. 商务确认后，项目经理提交给预算员。
7. 预算员确认签证已计入结算后，签证最终完成。

签证办理步骤

1. 进入“项目管理”。
2. 点击“签证”。
3. 点击新增签证。

4. 填写项目、签证内容、金额、附件。
5. 选择下一步负责人。
6. 提交后关注签证状态和提醒。
7. 如果超过一周未推进，系统会提醒负责人。

4. 产值结算

产值结算用于记录项目开票、结算、已付款和应付款情况。

重点字段：

- 结算金额
- 开票金额
- 已付款
- 按比例应付款
- 按比例应付未付款
- 100% 未付款

5. 甲方回款


甲方回款用于记录甲方实际付款情况，并与经营分析中的应收台账联动。

使用建议：

- 每次收到甲方付款后及时录入。
- 项目状态和付款比例会影响经营总览中的应收计算。
- 质保期满后的未收金额会进入账期风险。

五、施工管理

施工管理主要用于现场施工日志、拍照识别、人员出勤统计、项目日报汇总和月度经营月报。

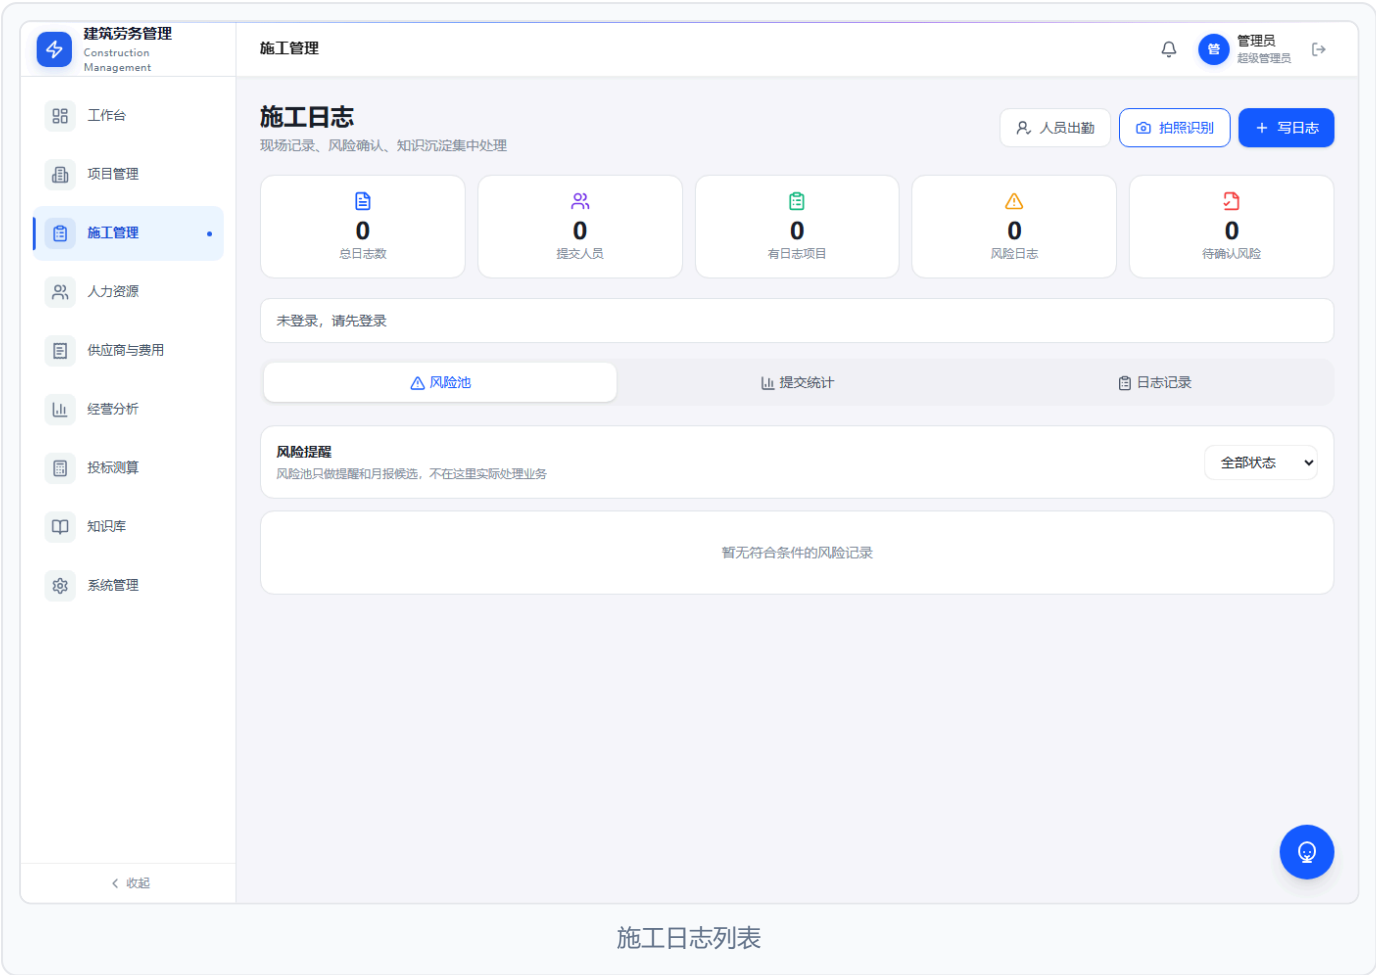

1. 施工日志提交规则

施工日志填写前要注意提交时效：

- 前一天下午 6 点至第二天早上 8 点：正常提交。
- 第二天早上 8 点至 12 点：允许补交，系统标记逾期提交。
- 第二天中午 12 点后：禁止提交前一天日志。

2. 写施工日志

建筑劳务管理
Construction Management

工作台

项目管理

施工管理

人力资源

供应商与费用

经营分析

投标测算

知识库

系统管理

施工管理

写施工日志

按项目填写施工内容，并从项目花名册勾选当天实际出勤人员

拍照识别

日志日期 *

2026/07/17

正常提交

当前可提交 2026-07-17 施工日志，截止 2026-07-18 08:00。
2026-07-17 18:00 至 2026-07-18 08:00 正常提交，08:00 至 12:00 为补交

项目明细 1

删除

项目 *

请选择项目

施工部位

例如：3#楼标准层、地下室底板

施工内容 *

这个项目今天做了什么工作?

出勤人员

已选 0 人，出勤人数将自动按勾选人数统计

全部工种

搜索姓名、工种、班组

当前项目暂无在场工人，请先在花名册维护工人档案

异常/问题

有无异常情况?

收起

写施工日志

填写步骤：

1. 进入“施工管理”。
2. 点击“写施工日志”或“新增日志”。
3. 选择日志日期。
4. 选择项目。
5. 填写施工部位。
6. 填写施工内容。
7. 选择工种。
8. 从当前项目在场工人中选择出勤人员。
9. 给每个出勤人员录入工时，可录入小数。
10. 填写异常或问题。
11. 提交。

注意：

- 退场人员不会出现在可选人员中。
- 如果提示当前项目暂无在场工人，请检查花名册中该工人是否绑定当前项目、是否为在场状态。
- 出勤工时会汇总到“人员出勤统计”页面。

3. 拍照识别施工日志

适合现场人员仍然习惯手写日志的情况。

操作步骤：

1. 进入施工日志页面。
2. 点击“拍照识别”。
3. 上传或拍摄施工日志照片。
4. 系统进行文字识别。
5. AI 自动整理施工内容。
6. 人工确认识别结果。
7. 补充项目、出勤人员和出勤工时。
8. 提交。

注意：

- 图片用于识别，不建议长期保存大文件。
- AI 整理结果必须人工确认后再提交。

4. 人员出勤统计

用于按项目、月份、工人统计施工日志中记录的总工时。

查看步骤：

1. 进入“施工管理”。
2. 点击“人员出勤统计”。
3. 选择项目和月份。
4. 查看每名工人当月总工时。
5. 需要核实时，可回到施工日志详情查看来源。

5. 项目日报汇总

项目日报汇总不是简单罗列日志，而是系统根据各项目施工日志进行 AI 萃取。

使用方式：

1. 每天中午 12 点后，系统生成前一天日报汇总。
2. 先查看公司所有项目总览。
3. 再切换查看单个项目详细情况。
4. 关注异常、风险和未提交日志项目。

6. 月度经营月报

月度经营月报用于按月形成项目经营分析，并进入流程确认。

流程说明：

1. 预算员填写自己负责项目的月度分析。
2. 提交给手动选择的项目经理。
3. 项目经理确认后，自动返回最初提交的预算员。

- 4. 预算员确认后选择提交给老板。
- 5. 每个节点都会产生提醒。
- 6. 草稿状态可以删除。

六、人力资源

人力资源用于管理工人档案、证件、工资核算、工资发放和工资查询。



1. 工人档案

工人档案保存必要信息：

- 姓名
- 年龄
- 性别
- 银行卡号
- 身份证号
- 联系方式
- 入场日期
- 所属项目
- 在场或退场状态

注意：

- 身份证号是唯一识别字段。
- 工人调动项目不会影响历史工资归属。
- WPS 同步时只同步必要字段，不保存身份证照片、银行卡照片等大文件。

2. WPS 花名册同步

如果公司使用 WPS 智能表单收集花名册，可以在系统管理中配置 WPS 同步。

同步逻辑：

1. 每个项目一个二维码。
2. WPS 多维表格中每个项目对应一个工作表。
3. 系统中配置 WPS 项目名称和系统项目名称绑定关系。
4. 工人填写表单后，数据进入 WPS。
5. 系统按配置同步到工人档案。

3. 工资核算

工资核算表示当月工资表。

查看步骤：

1. 进入“人力资源”。
2. 点击“工资核算”。
3. 选择项目和月份。
4. 查看每个工人的应发、实发、已发和发清状态。

4. 工资发放

工资发放表示已经实际发出去的钱，可以和工资核算所属月份不同。例如 5 月发 3 月工资。

导入要求：

- 项目名称必填
- 身份证号必填
- 工资所属月份必填
- 发放金额必填

导入后，系统会按项目、身份证号、工资所属月份同步到工资核算，显示该月已发多少。

异常处理：

- 如果该人员当月无工资，系统提醒核实，但可继续录入并特别标注。
- 如果工人不在花名册中，系统提示是否新增工人档案，允许后续补充资料。
- 重复导入会被拦截。
- 实发金额和发放金额差值在 1 元以内，视为已发清。

5. 工资查询


用于员工或管理人员查看工资发放情况。

查看步骤：

- 1. 进入 “人力资源” 。
- 2. 点击 “工资查询” 。
- 3. 按项目、月份或人员筛选。
- 4. 查看核算金额、已发金额和发清状态。

七、供应商与费用

供应商与费用用于管理供应商库、结算、付款、零星材料和综合费用。

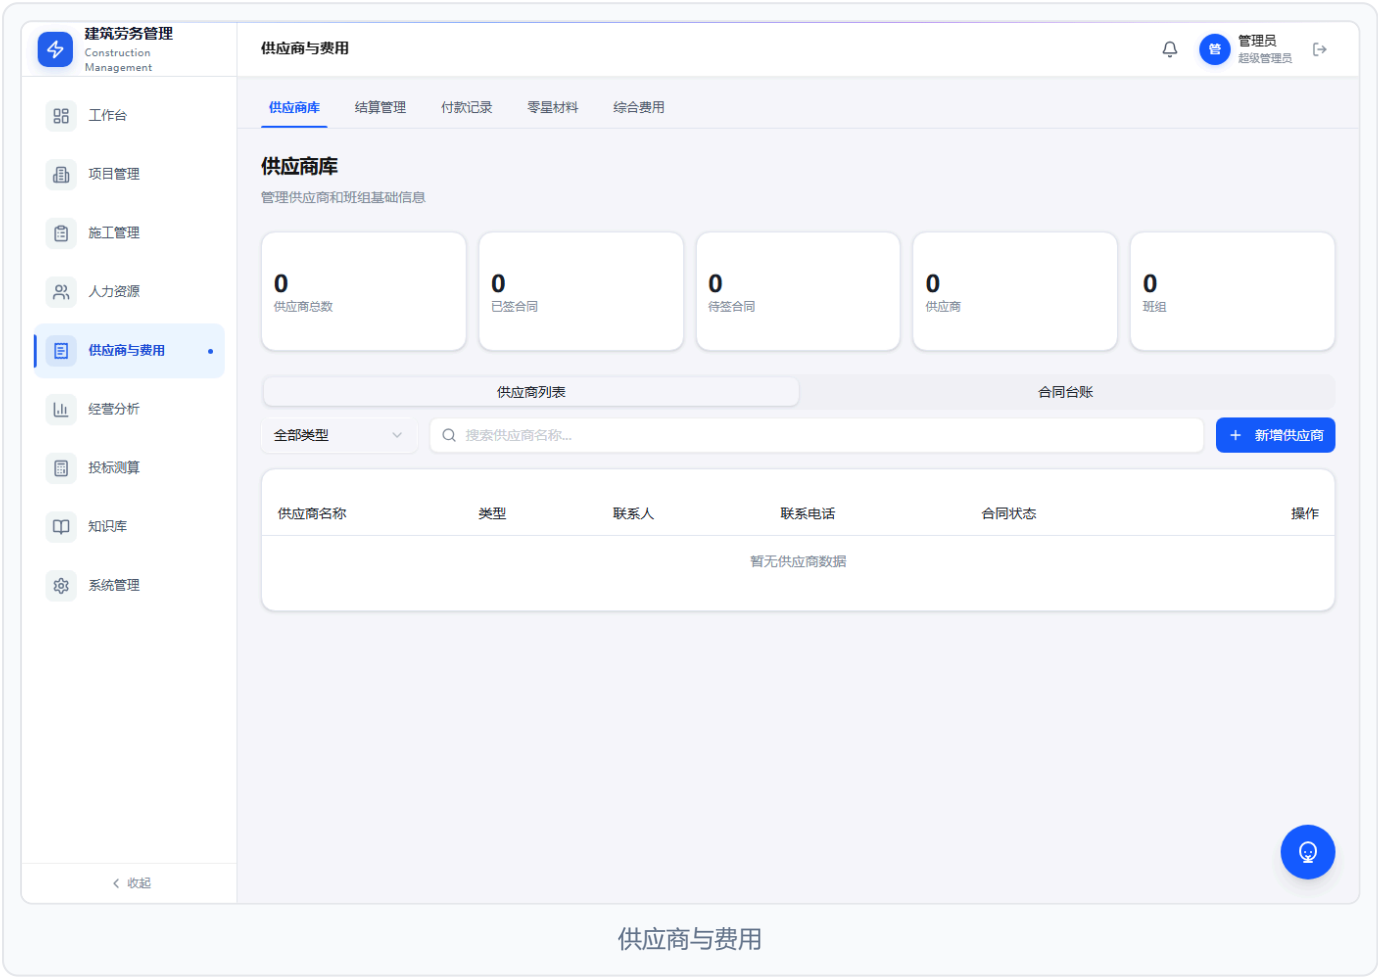

1. 供应商库

供应商库采用 “统计卡片 + 台账” 的形式。

重点查看：

- 供应商数量
- 已签合同
- 待签合同
- 累计结算额
- 供应商分类

操作步骤：

- 1. 进入 “供应商与费用” 。

2. 点击“供应商库”。
3. 查看顶部统计卡片。
4. 在台账中搜索供应商。
5. 进入详情查看合同、结算、付款和未付情况。

2. 结算管理

用于录入供应商或班组结算。

操作步骤：

1. 进入“结算管理”。
2. 点击新增结算。
3. 选择项目和供应商。
4. 填写结算金额、结算日期、结算类型和备注。
5. 保存后，系统会形成消息提醒，并可按配置推送钉钉。

3. 付款记录

用于记录已经实际支付给供应商的钱。

操作步骤：

1. 进入“付款记录”。
2. 点击新增付款。
3. 选择项目、供应商和对应结算。
4. 填写付款金额和付款日期。
5. 保存后，经营分析中的供应商成本会同步更新。

4. 零星材料

用于记录项目现场发生的小额辅材消耗。

操作步骤：


1. 进入“零星材料”。
2. 选择项目。
3. 填写材料名称、数量、单价和供应商。
4. 也可以使用拍照或语音识别。
5. AI 提炼后人工确认。
6. 保存后系统自动汇总到项目辅材消耗。

注意：

- 图片和音频只用于识别，不保存原文件。
- 材料费用必须绑定项目。

八、经营分析

经营分析主要给老板和管理层查看公司经营状况。

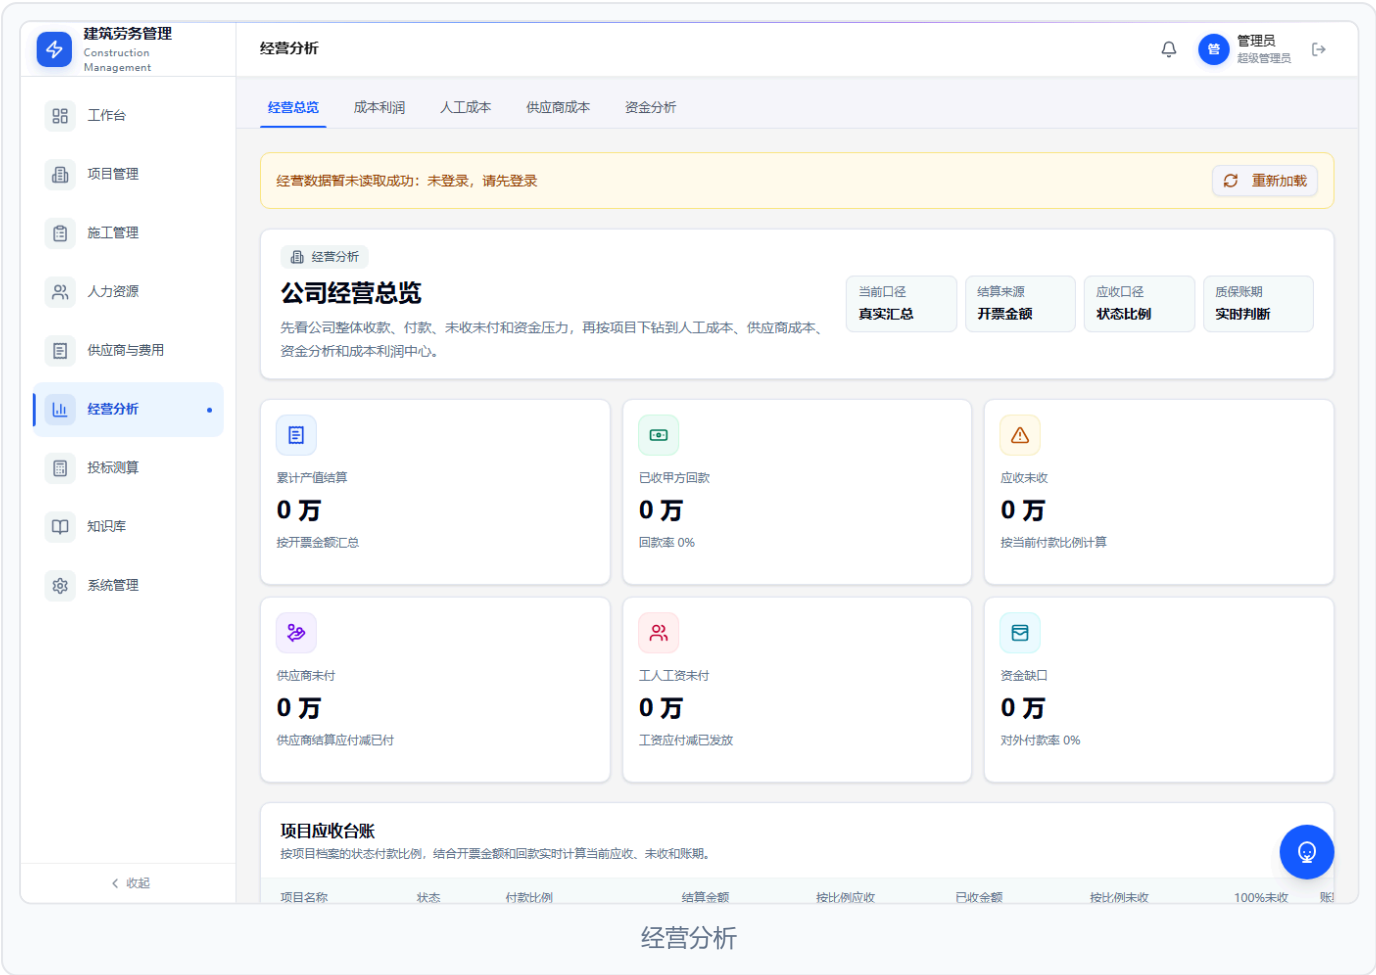

页面包括：

- 经营总览
- 成本利润
- 人工成本
- 供应商成本
- 资金分析

1. 经营总览

经营总览先看统计卡片，再看项目应收台账。

项目应收台账重点字段：

- 项目名称
- 状态
- 付款比例
- 结算金额，以开票金额为准
- 已收金额
- 按付款比例应收金额
- 按付款比例未收金额
- 100% 未收金额
- 账期

- 风险

使用步骤：

1. 进入“经营分析”。
2. 点击“经营总览”。
3. 查看顶部统计卡片。
4. 查看项目应收台账。
5. 对账期较长或风险较高的项目进行跟进。

2. 人工成本

人工成本来自工资核算和工资发放。

查看重点：

- 核算工资
- 已发工资
- 未发工资
- 发清率

3. 供应商成本

供应商成本与供应商与费用模块中的结算管理和付款记录关联。

查看重点：

- 每个项目供应商结算多少
- 应付多少
- 已付多少
- 未付多少
- 付款比例
- 进度应付款
- 决算应付款

4. 资金分析


用于查看公司收款、付款和资金压力。

使用建议：

- 甲方回款录入越及时，资金分析越准确。
- 工资发放和供应商付款录入越完整，资金压力判断越可靠。

九、投标测算

投标测算用于基于历史中标单价和人工成本单价辅助新项目报价。

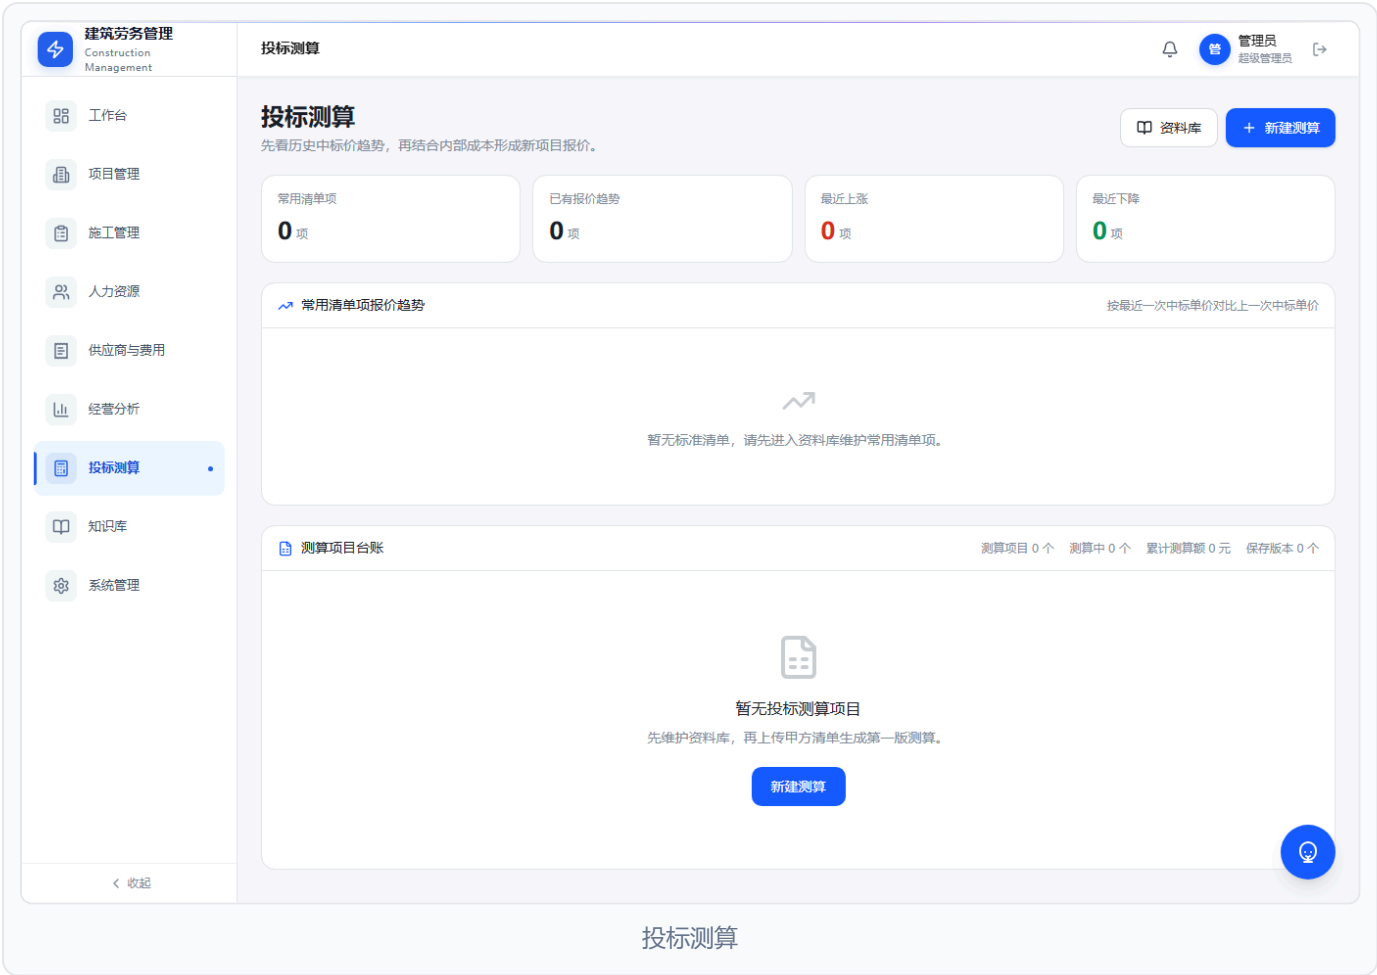

1. 历史数据查看

进入投标测算后，可以查看：

- 过去投标和成本数据
- 常用清单项报价趋势
- 最近一次中标单价与上一次中标单价差异
- 历史项目明细

2. 标准清单库

标准清单库用于维护公司内部统一清单编码。

操作步骤：

1. 进入“投标测算”。
2. 打开“标准清单库”。
3. 新增或批量导入标准清单。
4. 维护清单名称、编码、工程类型和是否含材料。
5. 如果导入清单时没有匹配项，可以当场新增标准清单。

3. 新建投标测算

操作步骤：

1. 进入“投标测算”。


- 2. 点击新建测算。
- 3. 上传报价清单。
- 4. 系统按清单名称相似度自动匹配标准清单。
- 5. 按地区、工程类型、是否含材料筛选历史价格。
- 6. 系统取最近一条中标单价和人工成本价。
- 7. 填写本次计划报价。
- 8. 设置管理费率和利润率。
- 9. 系统生成建议报价。
- 10. 如有需要，手动覆盖最终报价。
- 11. 点击保存。
- 12. 导出 Excel 测算表。

注意：

- 建议报价会特别提醒。
- 管理费率和利润率会叠加计算。
- 最终报价可人工调整。

十、知识库

知识库用于沉淀月度分析、施工日志、项目经验、合同报价经验和业务复盘。

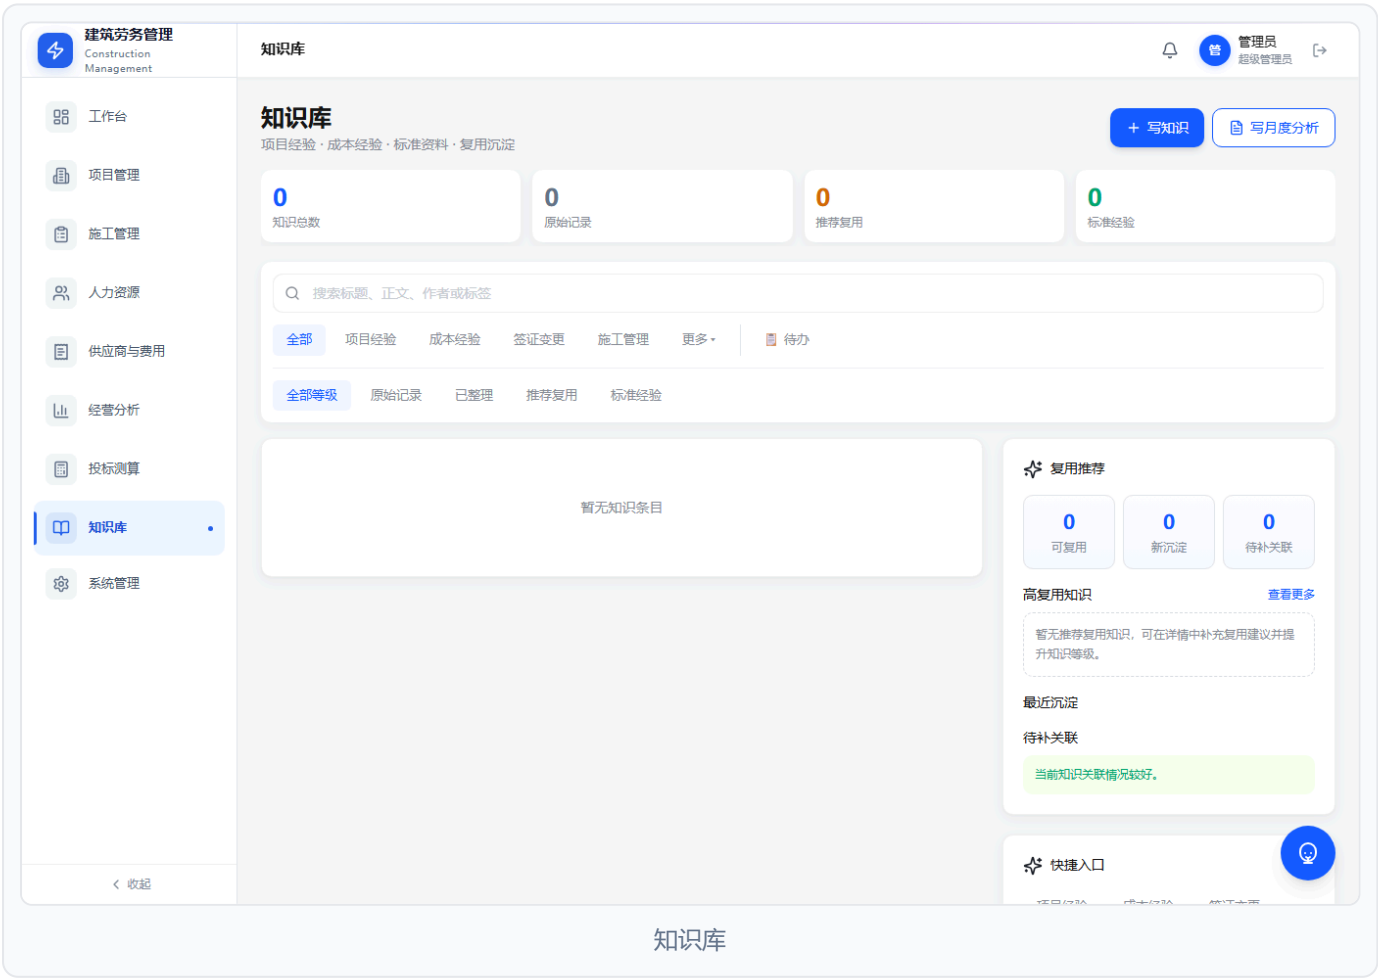

使用步骤

1. 进入“知识库”。
2. 使用搜索框查找项目、问题或关键词。
3. 按分类筛选知识。
4. 点击知识进入详情。
5. 查看关联项目、来源业务和沉淀内容。

月度分析状态

月度分析提交后，可以在知识库中查看状态。

常见状态：

- 草稿
- 已提交
- 项目经理确认中
- 预算员确认中
- 老板查看
- 已完成

草稿状态允许删除。

知识沉淀建议

每条知识尽量包含：

- 问题是什么
- 原因是什么
- 处理办法是什么
- 最终结果是什么
- 后续类似项目如何避免

十一、系统管理

系统管理主要由超级管理员使用。



页面包括：

- 用户与权限
- 后台账号
- 钉钉集成
- 业务流程配置
- 通知与待办
- WPS 花名册同步
- AI 配置
- 操作日志

1. 用户与权限

配置步骤：

1. 进入“系统管理”。
2. 点击“用户与权限”。
3. 新增或选择用户。
4. 选择岗位模板。
5. 勾选项目权限。
6. 如果该用户负责某些项目，需要单独勾选负责项目。
7. 保存。

注意：

- 超级管理员拥有全部权限，但负责项目仍需单独勾选。
- 普通用户只能查看被分配项目。
- 老板可以查看所有业务明细。

2. 钉钉集成

配置内容：

- 钉钉免登录
- 个人消息推送
- 群机器人 Webhook
- 测试发送
- 推送日志

使用建议：

1. 先配置钉钉基础参数。
2. 再测试个人消息。
3. 再测试群机器人。
4. 最后配置自动消息类型和接收人。

3. 通知与待办

用于配置哪些业务消息自动推送给哪些人。

配置步骤：

1. 进入“系统管理”。
2. 点击“通知与待办”。
3. 选择消息类型。
4. 绑定具体接收人员。
5. 设置是否推送钉钉。
6. 设置是否进入系统待办。
7. 保存。

自动消息应尽量带业务摘要，例如：

- 某供应商新增结算，金额多少。
- 某项目签证待项目经理推进。
- 某月度分析待预算员确认。

4. 业务流程配置

当前重点流程：

- 签证流程
- 月度分析流程

配置建议：

- 流程节点不要过多。
- 每个节点必须明确处理人。
- 每次提交后都应产生系统待办和钉钉提醒。

5. WPS 花名册同步

配置步骤：

1. 进入“系统管理”。
2. 点击“WPS 花名册同步”。
3. 填写 WPS 文档链接。
4. 配置系统项目名称与 WPS 工作表项目名称绑定。
5. 设置同步方式。
6. 保存配置。
7. 点击同步测试。
8. 查看同步结果和失败原因。

注意：

- 系统只同步必要字段。
- 不同步身份证照片、银行卡照片等大文件。
- 如果 WPS 项目名称和系统项目名称不一致，需要先维护映射。

6. AI 配置

用于配置系统中的 AI 能力：

- 施工日志 OCR 识别
- 语音识别
- 施工日志自动整理
- 项目日报汇总
- 知识库问答
- 投标测算辅助匹配

十二、常见问题

1. 为什么我看不到某个项目？

通常是项目权限未分配。联系管理员检查“用户与权限”中的项目勾选。

2. 为什么待办数量不对？

可能原因：

- 当前账号没有对应项目权限。
- 通知接收人未绑定。
- 业务流程没有正确提交到下一步。
- 系统待办和钉钉通知配置未开启。

3. 施工日志选择出勤人员时没有工人怎么办？

检查以下内容：

1. 工人是否已经在花名册中。
2. 工人是否绑定当前项目。
3. 工人是否为在场状态。
4. 是否选择了正确工种。

4. 工资发放和工资查询金额不一致怎么办？

先核对：

1. 工资所属月份是否一致。
2. 项目名称是否一致。
3. 身份证号是否一致。
4. 发放金额是否重复导入。
5. 是否存在无工资核算记录但手动确认导入的发放数据。

5. 供应商成本看板没有数据怎么办？

先确认：

1. 是否录入供应商结算。
2. 是否录入供应商付款。
3. 结算和付款是否绑定项目。
4. 是否有查看经营分析的权限。

6. 钉钉测试能收到，自动消息收不到怎么办？

检查：

1. 通知类型是否启用。
2. 是否绑定接收人。
3. 接收人是否绑定钉钉账号。
4. 该业务是否触发了自动消息。
5. 推送日志中是否有失败原因。

7. WPS 同步没有效果怎么办？

检查：

1. WPS 文档链接是否正确。
2. 是否配置项目名称映射。
3. WPS 工作表名称是否与配置一致。
4. 必填字段是否存在。
5. 同步日志是否有失败原因。

十三、日常使用建议

预算员每日建议

1. 进入工作台查看待办。
2. 查看签证、月度分析、报量相关提醒。
3. 处理项目管理中的报量和签证。
4. 查看甲方回款和项目应收。
5. 必要时维护投标测算历史数据。

项目经理每日建议

1. 提交施工日志。
2. 选择出勤人员并录入工时。
3. 处理签证推进提醒。
4. 查看项目日报汇总。

财务每日建议

1. 录入甲方回款。
2. 导入工资发放。
3. 录入供应商付款。
4. 核对资金分析和未付款。

老板每周建议

1. 查看经营总览。
2. 查看项目应收台账。
3. 关注账期风险。
4. 查看供应商和人工未付压力。
5. 查看成本利润异常项目。

管理员每周建议

1. 检查用户权限和项目分配。
2. 检查钉钉推送日志。
3. 检查 WPS 同步结果。
4. 检查操作日志。
5. 处理员工反馈的问题。

十四、培训使用顺序

建议首次培训按以下顺序进行：

1. 讲登录和权限。
2. 讲工作台和待办。

3. 预算员重点讲项目管理、报量、签证、月度分析。
4. 项目经理重点讲施工日志、出勤工时、签证推进。
5. 财务重点讲工资发放、供应商付款、甲方回款。
6. 老板重点讲经营分析。
7. 管理员重点讲系统管理、钉钉、WPS 和通知。

系统正式试用期间，建议先让预算员、项目经理、老板和财务使用一个月；稳定后，再让现场人员全员使用施工日志和零星材料录入。
